Fadhel Chemmem

De: William HO-TSAI <w.ho-tsai@ipco.bet> de la part de William HO-TSAI

Envoyé: mercredi 3 mai 2023 16:01

À: Fadhel Chemmem **Cc:** Alain de MARIGNAN


Objet: 20230503 - BELLE TERRE - Modifs GO

Bonjour Fahdel,


Peux-tu apporter les modifications suivantes pour vendredi 05/05 stp:

Collectifs T2:

- Il faudrait ajouter un garde-corps BA rampant dans l'escalier commun. Il faudra élargir l'escalier pour garder la largeur initiale.



- Il faut intégrer les GT en pignon (RDC et R+1)

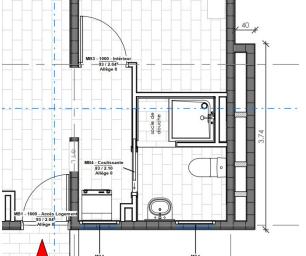

- Sur ce même pignon, il n'y a pas d'ouvertures pour fenêtres




- Passer la dalle de la circulation commune à une épaisseur de 15 cm.
- Peut-on mettre des semelles + poteaux sous l'escalier pour éviter les risques de fissuration ?

Collectifs T3:

- Passer la dalle de la circulation commune à une épaisseur de 15 cm.

Villas A et B:

- Il faudrait monter le mur d'échiffre de l'escalier à 1,05 m au-dessus du plancher haut brut RDC.
- l'escalier me parait étrange avec ses marches très étroites pour certaines. Ne semble pas correspondre au plan archi.
- Le mur en agglo pour l'escalier ne correspond pas aux plans archi, et fermeture sous escalier en agglo et non en placo

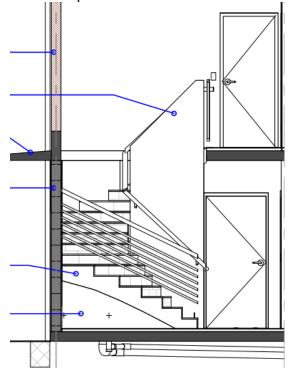

- Indiquer les pentes du dallage des abris voitures.
- Les casquettes ont une épaisseur de 8cm, ça passe pour le ferraillage ?

Jumelées :

- Indiquer les pentes du dallage des abris voitures.

Merci d'avance.

Cordialement,

William HO-TSAI Ingénieur chargé d'affaires 06 94 23 54 23 05 94 20 48 27 720 Route de Rémire 97354 REMIRE-MONTJOLY

